


Obra:		Fecha
68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y aparcamiento		25 de febrero del 2011.
C/San Antonio, Mislata. Valencia		
Presentes:	JOSE SOMOVILLA VICENTE	Director ejecutor de la obra
	MIGUEL ÁNGEL BAÑOS	Empresa Constructora
	MIQUEL GÓMEZ	Jefe de obra
	MIGUEL ÁNGEL MONSALVE	Encargado de obra


ACTIVIDAD: **CONDUCTOS DE VENTILACIÓN EN TRASTEROS.**

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Se detecta que la salida de los tubos de ventilación de los trasteros en planta baja están anclados a angulares de acero galvanizado los cuales están apoyados directamente sobre el forjado. Deberán colocarse piezas de neopreno entre estos angulares y el forjado, de manera que se evite la transmisión por vibración a éste.

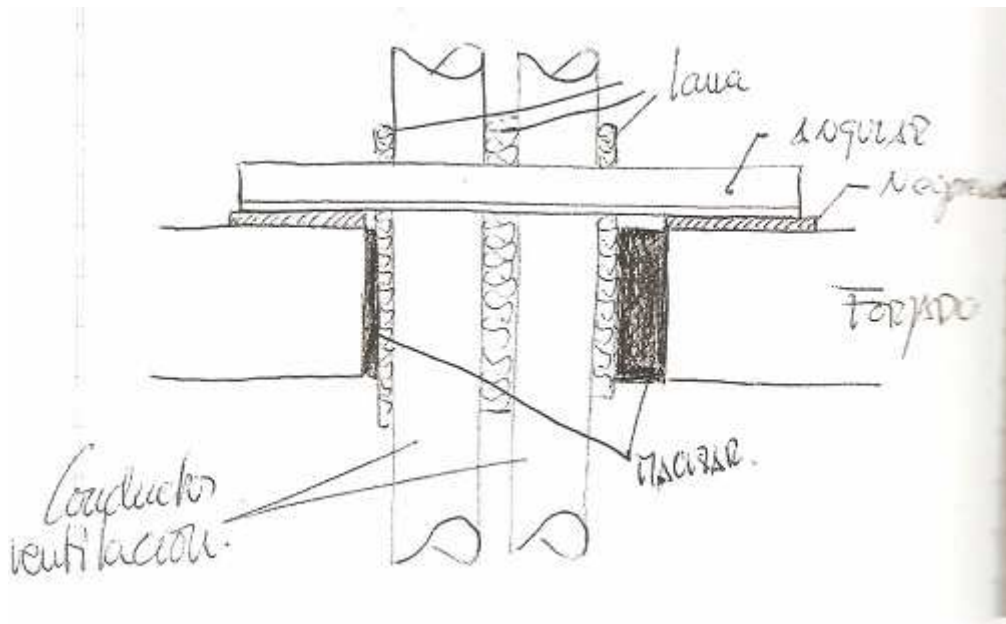


Se colocará un elemento elástico de manera que absorba la posible transmisión de vibraciones del ventilador al conducto en los pasillos de trasteros.

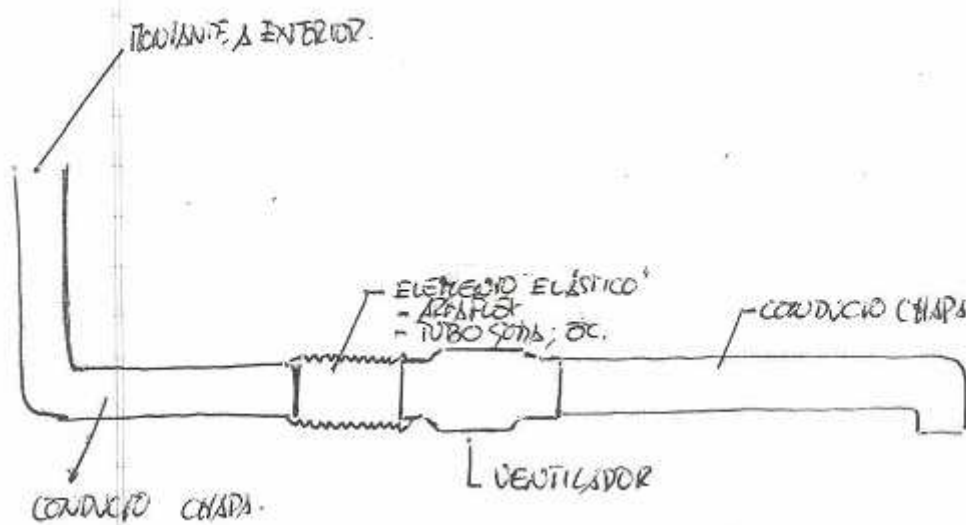

ACTIVIDAD: JUNTAS DE ANTEPECHO EN CUBIERTA.

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Se tendrá especial cuidado en la ejecución de las juntas realizadas en los antepechos, de manera que antes de sellarlas deberán cerciorarse de la total limpieza de la misma, de restos de mortero, cascotes, etc. que pudieran impedir el perfecto movimiento de dilatación y/o contracción del antepecho.



En caso de haberse utilizado poliestireno expandido "porex" para la ejecución de la junta, éste se quitará o quemará para liberar la misma.
