


Obra:		Fecha
68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y aparcamiento		24 de febrero del 2011.
C/San Antonio, Mislata. Valencia		
Presentes:	JOSE SOMOVILLA VICENTE	Director ejecutor de la obra
	MIQUEL GÓMEZ	Jefe de obra
	MIGUEL ÁNGEL MONSALVE	Encargado de obra
	ENRIQUE CALVET	Director de obra


ACTIVIDAD: **DISPOSICIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN ANTEPECHOS DE CUBIERTA.**

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Revisada la ejecución de los antepechos de cubierta vemos que únicamente se ha realizado la junta estructural en ellos, siendo insuficiente solo esta junta para evitar fisuras del mismo a consecuencia de dilataciones y contracciones.


Deberá ejecutarse una junta de dilatación en los mismos cada 9 m como máximo.

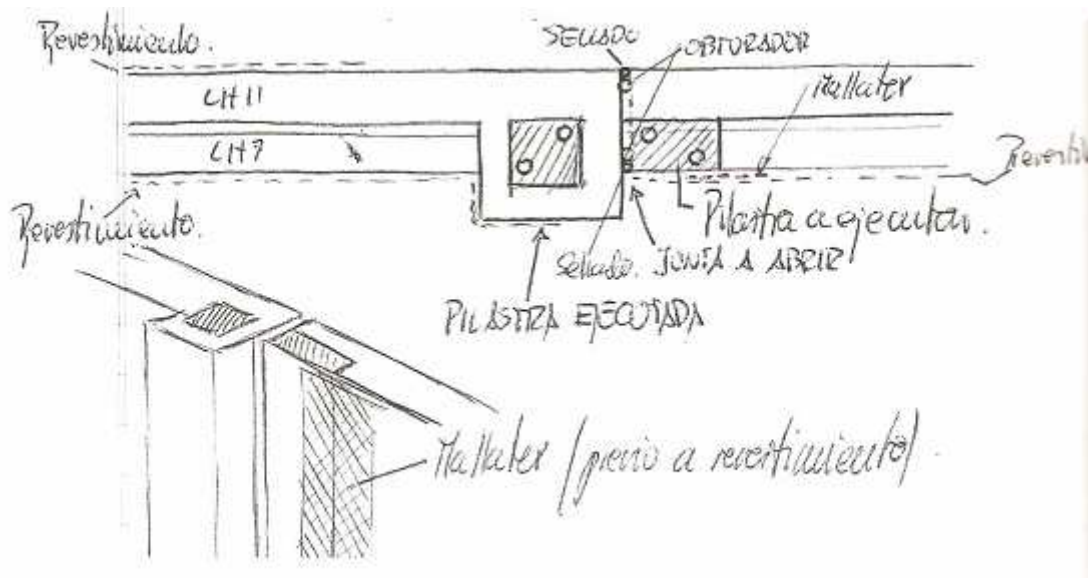

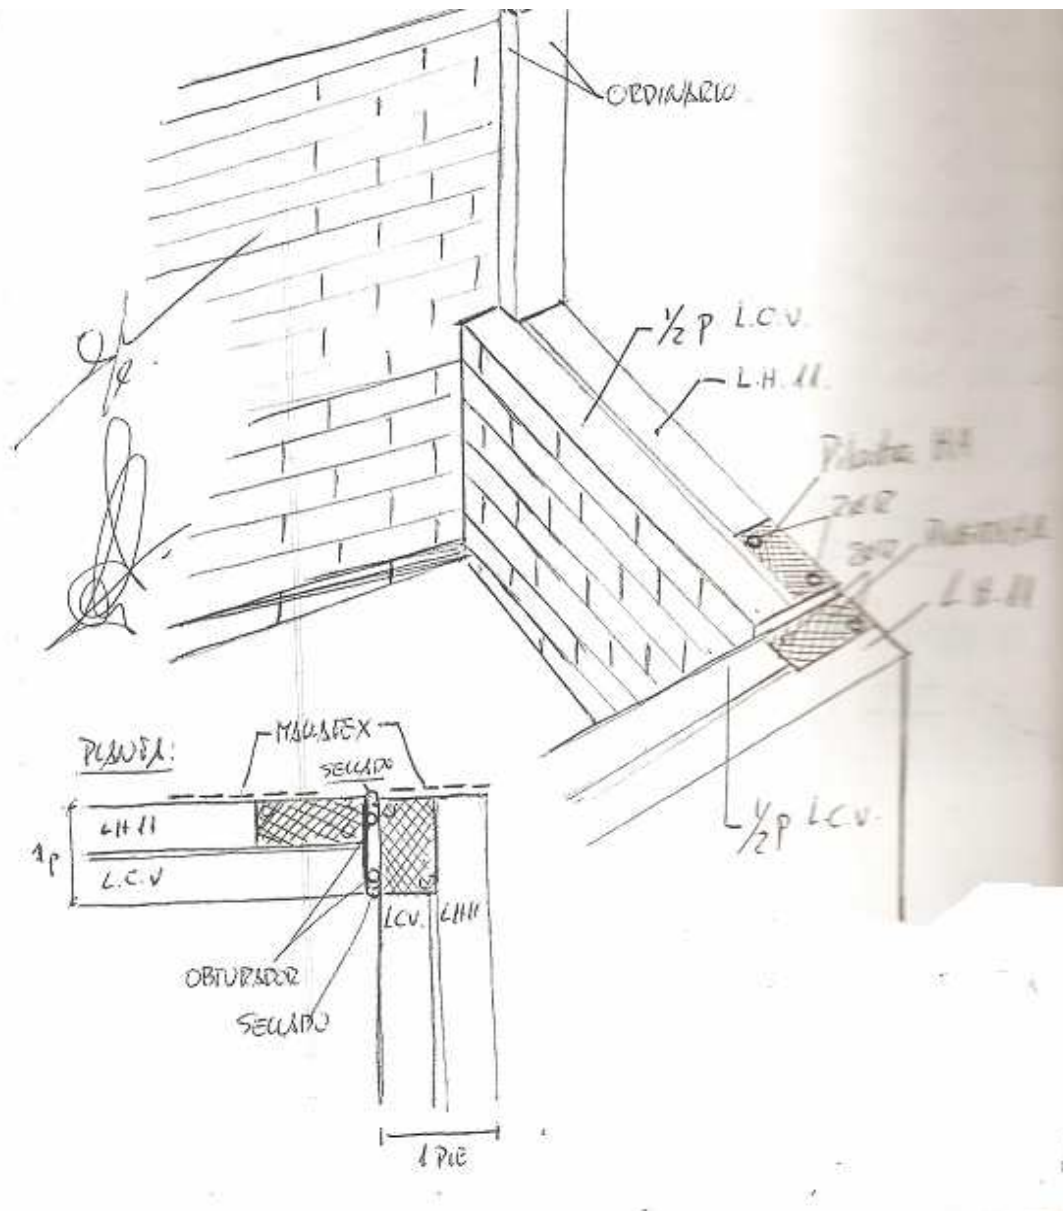

Deberá prestarse especial atención a los siguientes puntos:

1. La junta debe estar perfectamente limpia de restos de mortero, hormigón, cascotes, etc.
2. Colocación de mallatex en la unión de la pilastra con el ladrillo hueco de 11 cm.
3. Sellado, una vez comprobado que la junta está perfectamente limpia se procederá a la colocación de un obturador y posterior sellado con masilla de poliuretano para juntas estructurales, tipo sikaflex o similar.

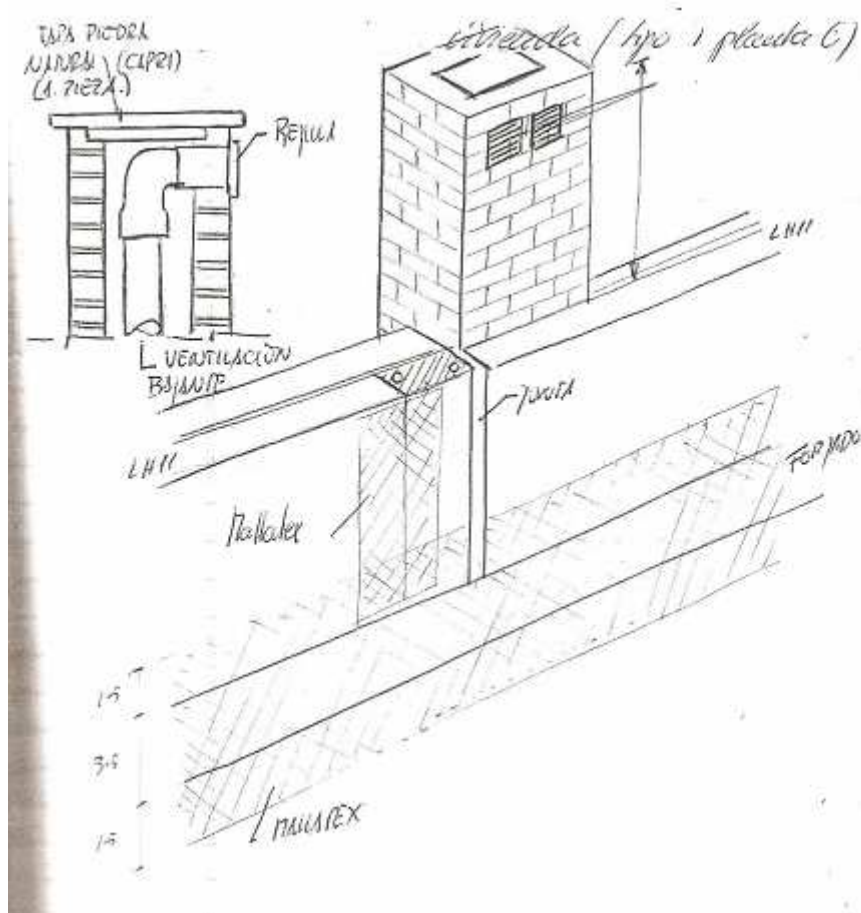

ACTIVIDAD: **ARMARIOS EMPOTRADOS.**

